



une
la
Ciudad


Campamentos

INFORME CAMPAMENTOS

Catastro y Metas 2022



Fases de Intervención del Programa



3 Estrategias de Intervención para dar solución habitacional a familias, dar cierre a los campamentos y evitar el repoblamiento

1.- RELOCALIZACIÓN

**2.- RADICACIÓN
PROYECTO URBANIZACIÓN**

**3.-RADICACIÓN
PROYECTO HABITACIONAL TRANSICIÓN HABITACIONAL**

4-RRELOCALIZACIÓN



Metas Programación Ancla 2022

| N° | Metas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic | Total |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| 1 | Inicio Gestión de Cierres | | | | | | | | | | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 2 | Habitabilidad Primaria | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | Fin de Intervención | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Inicio de Proyectos | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| 5 | Término de Proyectos | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 6 | Gestión de Suelos | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 7 | Calific. y/o Selec. de Proy. Habitacionales | | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 3 |
| 8 | Término de Diagnósticos Socio Territoriales | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
| 9 | Sesión de Mesas Técnicas Regionales | | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 3 |
| 10 | Asignación de Subsidios Habitacionales | | | | | | | | | | 190 | | 315 | 505 |
| 11 | Aplicación de Subsidios Habitacionales | | | | | | | | | | 75 | | 75 | 150 |



**167
CAMPAMENTOS**



**7.436
Familias**



**103
PROVINCIA CONCEPCIÓN**



**36
PROVINCIA BIOBÍO**



**28
PROVINCIA ARAUCO**

Metas 2022

1. Iniciar Gestión de Cierre de 10 campamentos (alguna de las 4 estrategias: Relocalización- Radicación con Urbanización -Radicación con Proyecto Habitacional- Relocalización con Transición habitacional).
2. Implementar Habitabilidad Primaria en 10 Campamentos..
3. Fin de Intervención en Campamentos (nada pendiente) en al menos 4 Campamentos.
4. Inicio de obras Habitacionales o Urbanización en Urbanización para al menos 2 Campamentos.
5. Termino de obras Habitacionales o de Urbanización para al menos 2 Campamentos.
6. Gestión de Suelos: Adquisición de al menos 2 terrenos adecuados para la ejecución de un proyecto CNT para familias de Campamentos .
7. Calificación - Selección de al menos 3 Proyectos habitacionales para familias de Campamentos.
8. Terminar el Diagnostico Socio-Territorial de a lo menos 10 Campamentos (identificación familias, características de grupos familias, análisis de los territorios).
9. Generar Mesa Técnica Regional de Campamentos, y sesionar val menos 3 veces en el año.
10. Asignar al menos 505 Subsidios Habitacionales para familias de Campamentos.
11. Lograr la Aplicación (subsidio utilizado y pagado) de al menos 150 subsidios ya asignados a familias de Campamentos.



une
la
Ciudad


Campamentos

Balance 2021

1. GESTIÓN DE CIERRE

OBJETIVO

Iniciar la gestión de cierre en 100 campamentos en el año 2021, mediante la entrega de una solución habitacional/ urbanización.

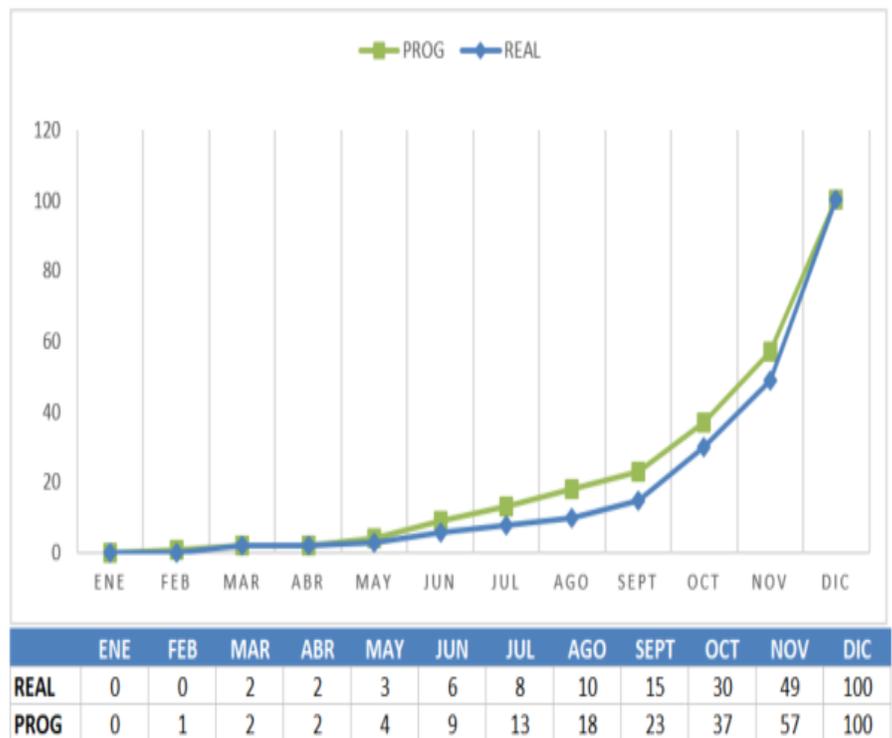

| REGIÓN | META | PROGRAMACIÓN ACUMULADA ENE-DIC | EJECUCIÓN ACUMULADA ENE- DIC | DESV |
|--------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| | ANUAL | | | |
| ARICA Y PARINACOTA | 1 | 1 | 2 | 100,0% (+1) |
| TARAPACÁ | 6 | 6 | 6 | 0,0% |
| ANTOFAGASTA | 6 | 6 | 6 | 0,0% |
| ATACAMA | 5 | 5 | 5 | 0,0% |
| COQUIMBO | 5 | 5 | 5 | 0,0% |
| VALPARAÍSO | 15 | 15 | 15 | 0,0% |
| METROPOLITANA | 15 | 15 | 12 | -20,0% (-3) |
| O'HIGGINS | 6 | 6 | 6 | 0,0% |
| MAULE | 3 | 3 | 3 | 0,0% |
| ÑUBLE | 4 | 4 | 4 | 0,0% |
| BIOBÍO | 15 | 15 | 15 | 0,0% |
| ARAUCANÍA | 6 | 6 | 6 | 0,0% |
| LOS RÍOS | 6 | 6 | 8 | 33,3% (+2) |
| LOS LAGOS | 6 | 6 | 6 | 0,0% |
| AYSÉN | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| MAGALLANES | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 0,0% |

EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE


Gestiones realizadas: 51

Gestiones programadas: 43

2. FIN DE INTERVENCIÓN

OBJETIVO

Llevar a cabo el fin de intervención en 58 campamentos durante el año 2021.

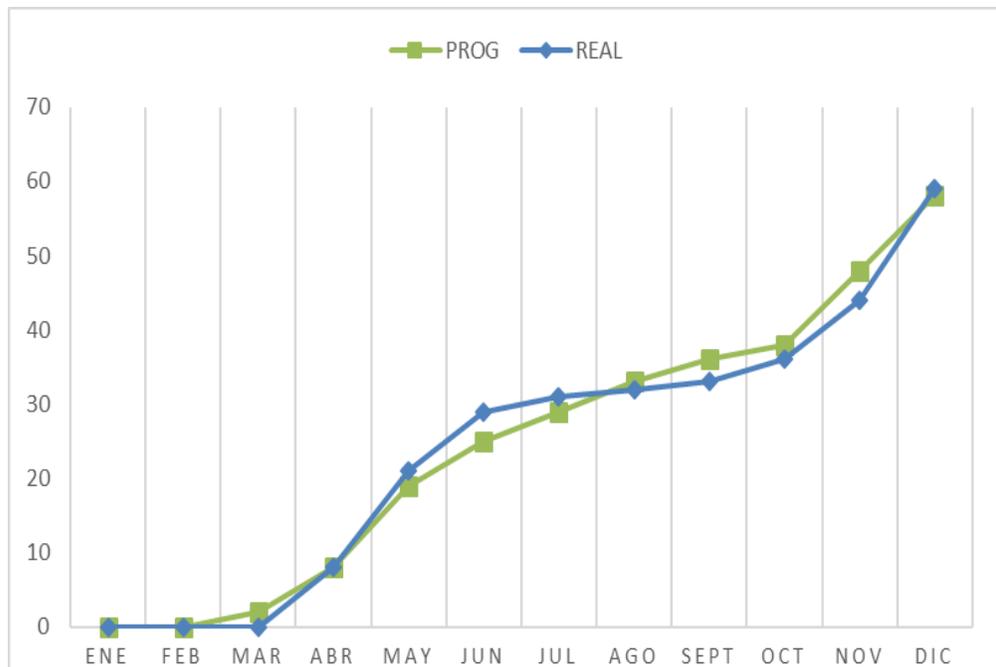

| REGIÓN | META | PROGRAMACIÓN ACUMULADA ENE-DIC | EJECUCIÓN ACUMULADA ENE-DIC | DESV |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | ANUAL | | | |
| ARICA Y PARINACOTA | 1 | 1 | 0 | -100,0% (-1) |
| TARAPACÁ | 1 | 1 | 0 | -100,0% (-1) |
| ANTOFAGASTA | 3 | 3 | 4 | 33,3% (+1) |
| ATACAMA | 3 | 3 | 3 | 0,0% |
| COQUIMBO | 4 | 4 | 4 | 0,0% |
| VALPARAÍSO | 7 | 7 | 7 | 0,0% |
| METROPOLITANA | 7 | 7 | 8 | 14,3% (+1) |
| O'HIGGINS | 5 | 5 | 5 | 0,0% |
| MAULE | 7 | 7 | 7 | 0,0% |
| ÑUBLE | 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| BIOBÍO | 6 | 6 | 6 | 0,0% |
| ARAUCANÍA | 4 | 4 | 4 | 0,0% |
| LOS RÍOS | 3 | 3 | 4 | 33,3% (+1) |
| LOS LAGOS | 4 | 4 | 4 | 0,0% |
| AYSÉN | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| MAGALLANES | - | - | - | - |
| TOTAL | 58 | 58 | 59 | 1,7% (+1) |

JUSTIFICACIONES:

Arica y Parinacota:

Camp. Areneros II., a la espera de finalización de proyectos vinculados.

Tarapacá:

Camp. La Ballenera, Las familias que cuentan con subsidio individual se encuentran a la espera de la tramitación de incremento por parte de DPH.

EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE


Gestiones realizadas: 15

Gestiones programadas: 10

3. INICIO DE OBRAS DE PROYECTO HABITACIONAL O URBANIZACIONES

OBJETIVO

Iniciar 20 proyectos habitacionales o urbanizaciones durante el año 2021.

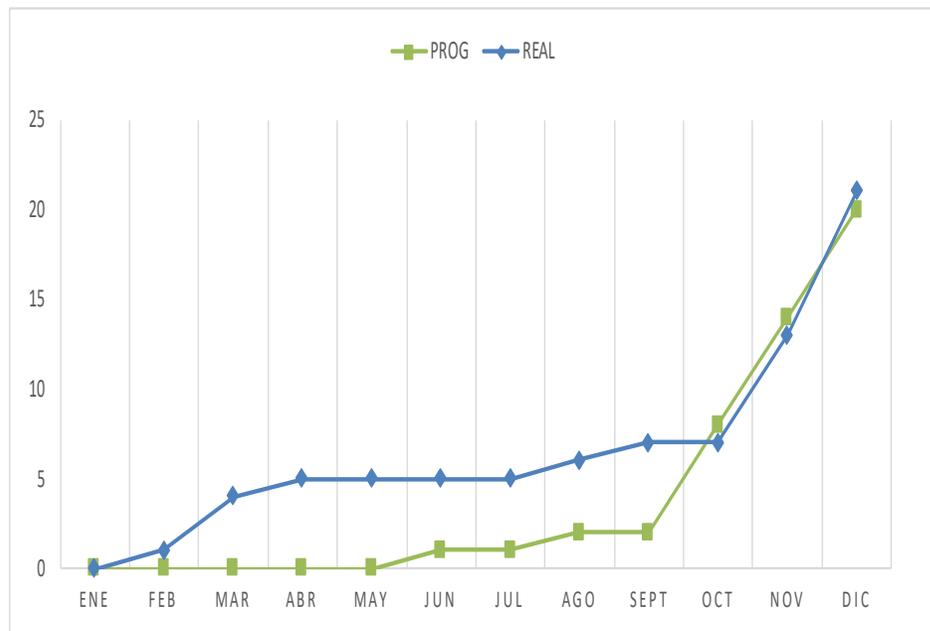

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| REAL | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 13 | 21 |
| PROG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 20 |

| REGIÓN | META | PROGRAMACIÓN ACUMULADA ENE- DIC | EJECUCIÓN ACUMULADA ENE-DIC | DESV |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | ANUAL | | | |
| ARICA Y PARINACOTA | 1 | 1 | 0 | -100,0% (-1) |
| TARAPACÁ | 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| ANTOFAGASTA | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| ATACAMA | 1 | 1 | 2 | 100,0% (+1) |
| COQUIMBO | 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| VALPARAÍSO | 3 | 3 | 4 | 33,3% (+1) |
| METROPOLITANA | 2 | 2 | 1 | -50,0% (-1) |
| O´HIGGINS | - | - | - | - |
| MAULE | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| ÑUBLE | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| BIOBÍO | 3 | 3 | 3 | 0,0% |
| ARAUCANÍA | 1 | 1 | 2 | 100,0% (+1) |
| LOS RIOS | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| LOS LAGOS | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| AYSÉN | - | - | - | - |
| MAGALLANES | - | - | - | - |
| TOTAL | 20 | 20 | 21 | 5,0% (+1) |

JUSTIFICACIONES:

Arica y Parinacota:

Sin terreno disponible para realización de proyecto habitacional.

Metropolitana:

Py. Sol de Polpaico de Tiltill, en proceso se subsanación de observaciones para la obtención de la calificación.

EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE


Gestiones realizadas: 8

Gestiones programadas: 6

4. TÉRMINO DE OBRAS DE PROYECTO HABITACIONAL O URBANIZACIONES

OBJETIVO

Terminar 24 proyectos habitacionales o urbanizaciones durante el año 2021.

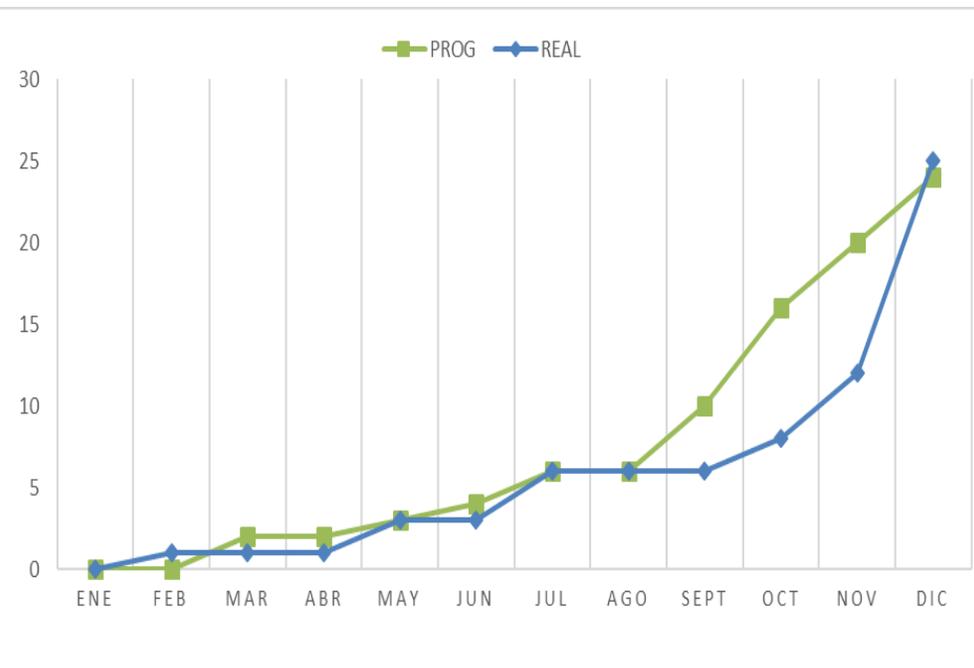

| REGIÓN | META | PROGRAMACIÓN ACUMULADA ENE-DIC | EJECUCIÓN ACUMULADA ENE-DIC | DESV |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | ANUAL | | | |
| ARICA Y PARINACOTA | - | - | - | - |
| TARAPACÁ | 2 | 2 | 1 | -50,0% (-1) |
| ANTOFAGASTA | 2 | 2 | 0 | -100,0% (-2) |
| ATACAMA | 3 | 3 | 5 | 66,7% (+2) |
| COQUIMBO | 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| VALPARAÍSO | 4 | 4 | 4 | 0,0% |
| METROPOLITANA | 3 | 3 | 2 | -33,3% (-1) |
| O´HIGGINS | 1 | 1 | 2 | 100,0% (+1) |
| MAULE | - | - | - | - |
| ÑUBLE | 1 | 1 | 0 | -100,0% (-1) |
| BIOBÍO | 4 | 4 | 4 | 0,0% |
| ARAUCANÍA | - | - | - | - |
| LOS RIOS | 1 | 1 | 4 | 300,0% (+3) |
| LOS LAGOS | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| AYSÉN | - | - | - | - |
| MAGALLANES | - | - | - | - |
| TOTAL | 24 | 24 | 25 | 4,2% (+1) |

EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE

Gestiones realizadas: 13

Gestiones programadas: 4

JUSTIFICACIONES:

Tarapacá:

Py Amancer, Alto Hospicio, con aumento de plazo, por temas de recepción de obras-

Antofagasta:

- Py. Salar de Atacama. Requiere estudio complementario.
- Py. Bellevista de Antofagasta, retraso por proceso de recontractación.

Metropolitana:

Quebradas del Maipo, San José de Maipo, retrasos asociados a mano de obra por pandemia.


Ñuble:

Oro Verde, Chillán: Falta de recursos asociados a mano de obra.

5. CALIFICACIÓN Y/O SELECCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL

OBJETIVO

Calificar o seleccionar 25 proyectos habitacionales, vinculados a familias de campamentos en el año 2021.

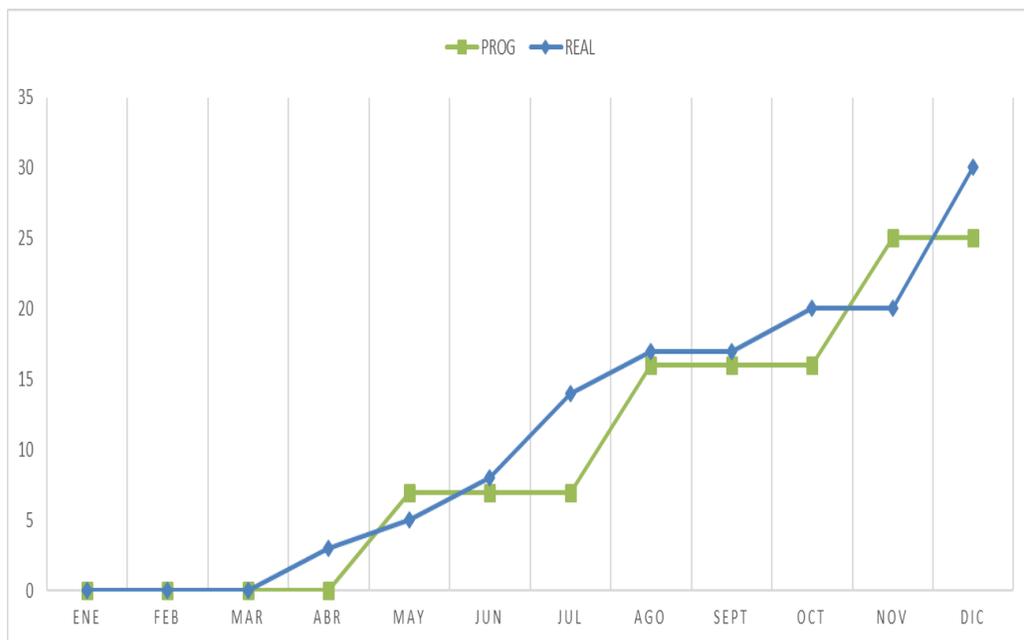

| REGIÓN | META | PROGRAMACIÓN ACUMULADA ENE-DIC | EJECUCIÓN ACUMULADA ENE-DIC | DESV |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | ANUAL | | | |
| ARICA Y PARINACOTA | - | - | 0 | - |
| TARAPACÁ | 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| ANTOFAGASTA | 3 | 3 | 8 | 166,7% (+5) |
| ATACAMA | 2 | 2 | 4 | 100,0% (+2) |
| COQUIMBO | 4 | 4 | 1 | -75,0% (-3) |
| VALPARAÍSO | 3 | 3 | 0 | -100,0% (-3) |
| METROPOLITANA | 3 | 3 | 5 | 66,7% (+2) |
| O'HIGGINS | - | - | 0 | - |
| MAULE | - | - | 0 | - |
| ÑUBLE | - | - | 0 | - |
| BIOBÍO | 2 | 2 | 3 | 50,0% (+1) |
| ARAUCANÍA | 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| LOS RÍOS | 2 | 2 | 0 | -100,0% (-2) |
| LOS LAGOS | 2 | 2 | 5 | 150,0% (+3) |
| AYSÉN | - | - | 0 | - |
| MAGALLANES | - | - | 0 | - |
| TOTAL | 25 | 25 | 30 | 20,0% (+5) |

JUSTIFICACIONES:

Coquimbo:

Proyectos Altos de Chuchiñi, Py. Nuevo Amanecer de Tahuinco y Py. Villa La Cruz, retrasos relacionados a diferentes variables.

Valparaíso:

Py. Sector Estadio y La Viuda y Py. Villa Alemana, retrasos relacionados a diferentes variables.

Los Ríos:

Py. San Carlos y PY. Nanguil, retrasos relacionados a diferentes variables.

EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE


Gestiones realizadas: 10

Gestiones programadas: 0

6. HABITABILIDAD PRIMARIA

OBJETIVO

Iniciar obras o acciones de habitabilidad primaria en 100 campamentos en el año 2021.

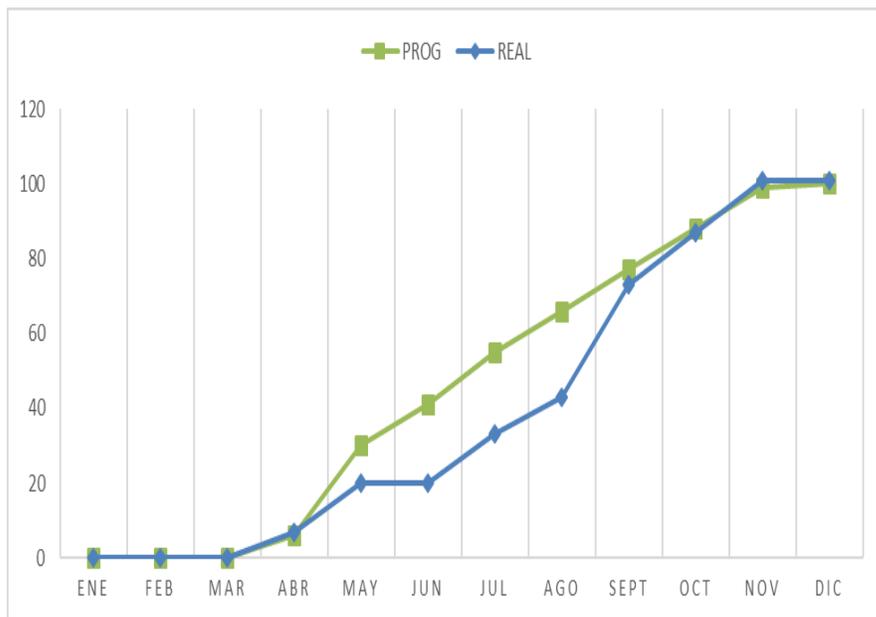

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| REAL | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 20 | 33 | 43 | 73 | 87 | 101 | 101 |
| PROG | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 41 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 100 |

| REGIÓN | META | PROGRAMACIÓN ACUMULADA ENE-DIC | EJECUCIÓN ACUMULADA ENE-DIC | DESV |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | ANUAL | | | |
| ARICA Y PARINACOTA | 0 | 0 | 2 | +2 |
| TARAPACÁ | 15 | 15 | 15 | 0,0% |
| ANTOFAGASTA | 15 | 15 | 15 | 0,0% |
| ATACAMA | 15 | 15 | 19 | 26,7% (+4) |
| COQUIMBO | 2 | 2 | 4 | 100,0% (+2) |
| VALPARAÍSO | 15 | 15 | 16 | 6,7% (+1) |
| METROPOLITANA | 15 | 15 | 15 | 0,0% |
| O'HIGGINS | 3 | 3 | 4 | 33,3% (+1) |
| MAULE | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| ÑUBLE | 1 | 1 | 0 | -100,0% (-1) |
| BIOBÍO | 10 | 10 | 6 | -40,0% (-4) |
| ARAUCANÍA | 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| LOS RÍOS | 3 | 3 | 0 | -100,0% (-3) |
| LOS LAGOS | 3 | 3 | 3 | 0,0% |
| AYSÉN | 1 | 1 | 0 | -100,0% (-1) |
| MAGALLANES | 0 | 0 | 0 | - |
| TOTAL | 100 | 100 | 101 | 1,0% (+1) |

JUSTIFICACIONES:

Ñuble: Validadores enviados por equipo regional en diciembre, en revisión del equipo técnico del nivel central.

Biobío: Validadores enviados por equipo regional en diciembre, en revisión del equipo técnico del nivel central

Los Ríos: Atraso en las gestiones debido a que la primera licitación se declara desierta sin oferentes. Se realizó una segunda licitación, que está en proceso de adjudicación.

Aysén: Validadores enviados por equipo regional en diciembre, con observaciones no subsanadas (no existen antecedentes que presenten explícitamente inicio de obras y/o acciones en el territorio).

EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE


Gestiones realizadas: 0

Gestiones programadas: 1

7. GESTIÓN DE SUELOS

OBJETIVO

Iniciar la gestión de suelos en 25 terrenos, que permitan dar solución a familias de campamentos en el año 2021.

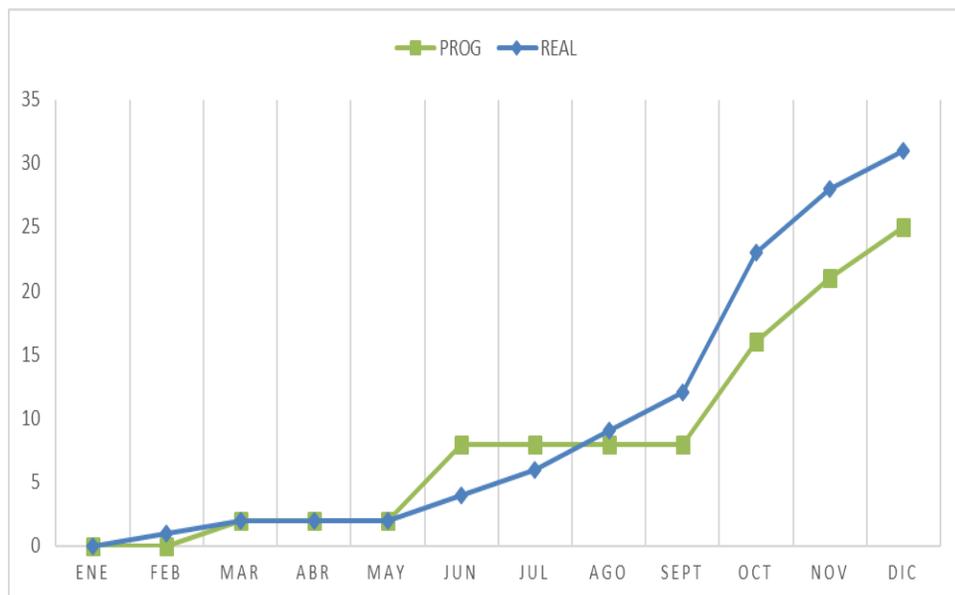

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| REAL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 23 | 28 | 31 |
| PROG | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 21 | 25 |

| REGIÓN | META | PROGRAMACIÓN ACUMULADA ENE-DIC | EJECUCIÓN ACUMULADA ENE-DIC | DESV |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | ANUAL | | | |
| ARICA Y PARINACOTA | 1 | 1 | 0 | -100,0% (-1) |
| TARAPACÁ | 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| ANTOFAGASTA | 2 | 2 | 2 | 0,0% |
| ATACAMA | 2 | 2 | 4 | 100,0% (+2) |
| COQUIMBO | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| VALPARAÍSO | 3 | 3 | 5 | 66,7% (+2) |
| METROPOLITANA | 3 | 3 | 3 | 0,0% |
| O'HIGGINS | 1 | 1 | 0 | -100,0% (-1) |
| MAULE | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| ÑUBLE | 1 | 1 | 2 | 100,0% (+1) |
| BIOBÍO | 4 | 4 | 6 | 50,0% (+2) |
| ARAUCANÍA | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| LOS RÍOS | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| LOS LAGOS | 1 | 1 | 2 | 100,0% (+1) |
| AYSÉN | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| MAGALLANES | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL | 25 | 25 | 31 | 24,0% (+6) |

EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE

Gestiones realizadas: 3

Gestiones programadas: 4

JUSTIFICACIONES:

Arica y Parinacota:

Tres terrenos en la comuna de Arica en proceso de ingreso a DITEC. Gestiones para el año 2022.


O'Higgins:

Terreno en camp. Las Ranas de Chimbarongo, en estudio de título de dominio. Gestiones para el año 2022.

8. ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS HABITACIONALES

OBJETIVO

Asignar 5.000 subsidios a familias campamentos.

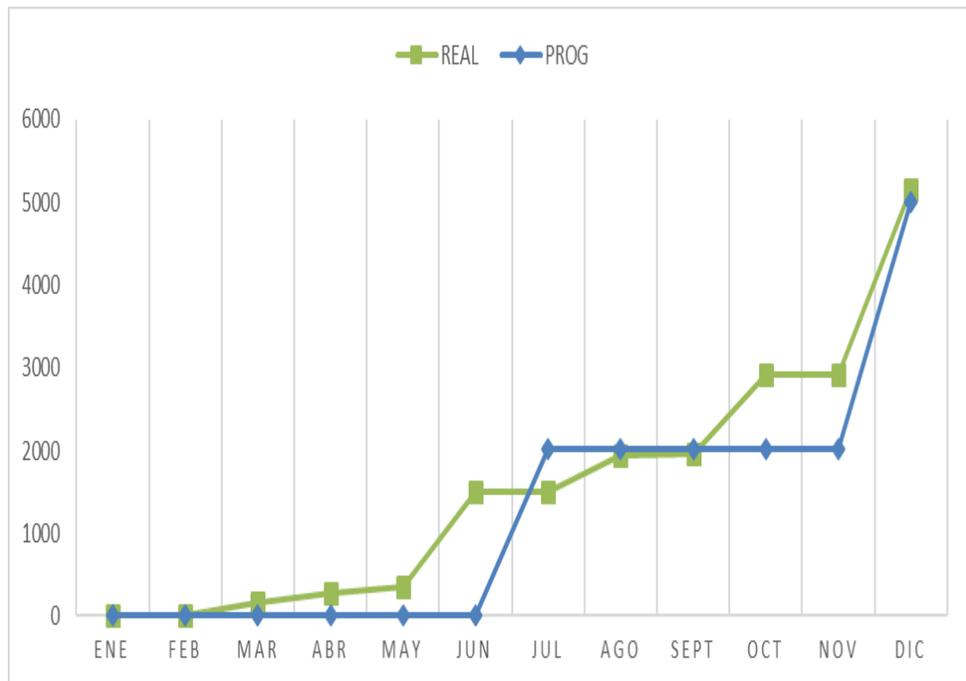

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| REAL | 0 | 0 | 161 | 274 | 349 | 1.497 | 1.497 | 1.938 | 1.961 | 2.917 | 2.917 | 5154 |
| PROG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 5.000 |

| REGIÓN | META | PROGRAMACIÓN ACUMULADA ENE-DIC | EJECUCIÓN ACUMULADA A ENE-DIC | DESV |
|--------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | ANUAL | | | |
| ARICA Y PARINACOTA | 130 | 130 | 41 | -68,5% (-89) |
| TARAPACÁ | 500 | 500 | 519 | 3,8% (+8) |
| ANTOFAGASTA | 680 | 680 | 717 | 5,4% (+37) |
| ATACAMA | 550 | 550 | 497 | -9,6% (-53) |
| COQUIMBO | 200 | 200 | 114 | -43,0% (-86) |
| VALPARAÍSO | 474 | 474 | 413 | -12,9% (-61) |
| METROPOLITANA | 900 | 900 | 1.180 | 31,1% (+276) |
| O'HIGGINS | 150 | 150 | 66 | -56,0% (-84) |
| MAULE | 12 | 12 | 24 | 100,0% (+12) |
| ÑUBLE | 50 | 50 | 66 | 32,0% (+17) |
| BIOBÍO | 500 | 500 | 674 | 34,8% (+184) |
| ARAUCANÍA | 100 | 100 | 102 | 2,0% (+8) |
| LOS RÍOS | 210 | 210 | 180 | -14,3% (-30) |
| LOS LAGOS | 524 | 524 | 538 | 2,7% (+12) |
| AYSÉN | 10 | 10 | 13 | 30,0% (+3) |
| MAGALLANES | 10 | 10 | 10 | 0,0% |
| TOTAL | 5.000 | 5.000 | 5.154 | 3,1% (+154) |

EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE


Gestiones realizadas: 0

Gestiones programadas: 0

9. TÉRMINO DE DIAGNÓSTICOS SOCIO-TERRITORIALES

OBJETIVO

Terminar diagnósticos socio-territorial de 471 nuevos campamentos del registro actualizado.

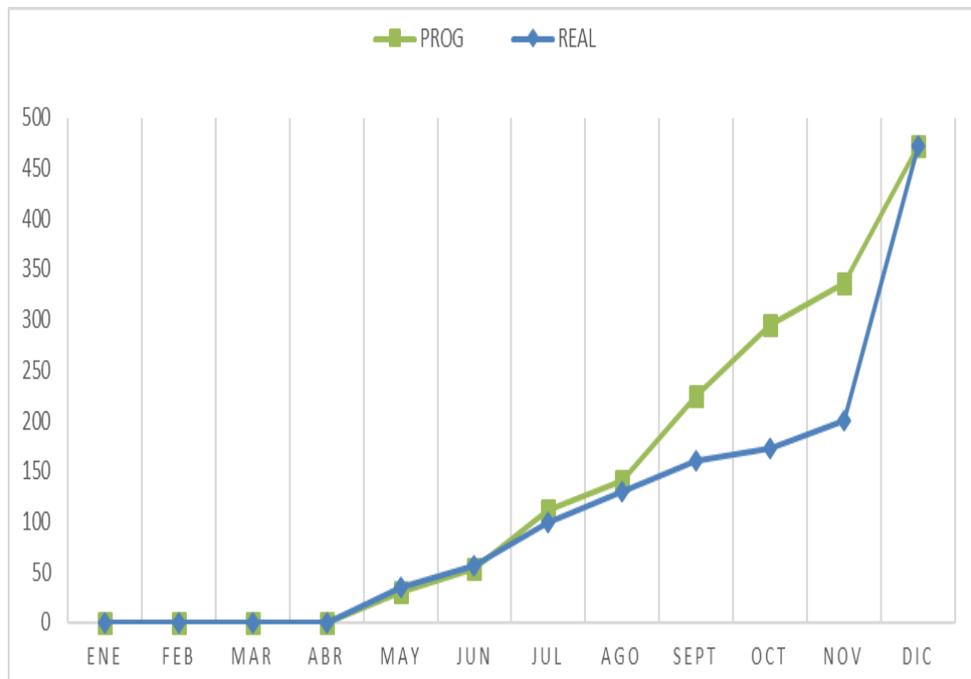

| REGIÓN | META | PROGRAMACIÓN ACUMULADA ENE-DIC | EJECUCIÓN ACUMULADA ENE-DIC | DESV |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | ANUAL | | | |
| ARICA Y PARINACOTA | 5 | 5 | 4 | -20,0% (-1) |
| TARAPACÁ | 37 | 37 | 38 | 2,7% (+1) |
| ANTOFAGASTA | 69 | 69 | 70 | 1,4% (+1) |
| ATACAMA | 56 | 56 | 57 | 1,8% (+1) |
| COQUIMBO | 17 | 17 | 18 | 5,9% (+1) |
| VALPARAÍSO | 75 | 75 | 65 | -13,3% (-10) |
| METROPOLITANA | 49 | 49 | 49 | 0,0% |
| O'HIGGINS | 28 | 28 | 27 | -3,6% (-1) |
| MAULE | 11 | 11 | 13 | 18,2% (+2) |
| ÑUBLE | 9 | 9 | 9 | 0,0% |
| BIOBÍO | 45 | 45 | 48 | 6,7% (+3) |
| ARAUCANÍA | 20 | 20 | 20 | 0,0% |
| LOS RÍOS | 16 | 16 | 20 | 25,0% (+4) |
| LOS LAGOS | 29 | 29 | 29 | 0,0% |
| AYSÉN | 4 | 4 | 4 | 0,0% |
| MAGALLANES | 1 | 1 | 1 | 0,0% |
| TOTAL | 471 | 471 | 472 | 0,2% (+1) |

EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE

Gestiones realizadas: 272

Gestiones programadas: 135

JUSTIFICACIONES:

Arica y Parinacota, Valparaíso y O'Higgins:

Retraso en un diagnóstico. Finalizará en enero y febrero.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DESDE: 01-enero-2021

HASTA: 31-diciembre-2021


| SUB | SUBTÍTULO | PRESUPUESTO LEY M\$ | PRESUPUESTO VIGENTE M\$ (incorpora las modificaciones presupuestarias actuales) | PRESUPUESTO EJECUTADO M\$ | EJECUCIÓN |
|-----|--------------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------|
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 789.598 | 739.373 | 729.796 | 99 % |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS | 367.580 | 146.244 | 129.521 | 89 % |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 15.184 | 34.500 | 34.500 | 100 % |
| 33 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 20.400.816 | 32.623.099 | 29.905.333 | 92 % |
| | TOTAL | 21.573.178 | 33.543.216 | 30.799.150 | 92 % |

RESUMEN DE GESTIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2021

| CONSOLIDADO DE GESTIÓN DE METAS DICIEMBRE 2021 | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| REGIÓN | INDICADOR | 1. GESTIÓN DE CIERRE | 2. FIN DE INTERVENCIÓN | 3. INICIO DE OBRA | 4. TÉRMINO DE OBRA | 5. CALIFICACIÓN Y/O SELECCIÓN DE PROYECTOS | 6. HABITABILIDAD PRIMARIA | 7. GESTIÓN DE SUELOS | 8. ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS | 9. TÉRMINO DE DIAGNÓSTICO |
| | | ARICA Y PARINACOTA | | | | | | | | |
| TARAPACÁ | | | | | | | | | | |
| ANTOFAGASTA | | | | | | | | | | |
| ATACAMA | | | | | | | | | | |
| COQUIMBO | | | | | | | | | | |
| VALPARAÍSO | | | | | | | | | | |
| METROPOLITANA | | | | | | | | | | |
| O'HIGGINS | | | | | | | | | | |
| MAULE | | | | | | | | | | |
| ÑUBLE | | | | | | | | | | |
| BIOBÍO | | | | | | | | | | |
| ARAUCANÍA | | | | | | | | | | |
| LOS RÍOS | | | | | | | | | | |
| LOS LAGOS | | | | | | | | | | |
| AYSÉN | | | | | | | | | | |
| MAGALLANES | | | | | | | | | | |
| RESUMEN | | | | | | | | | | |

 Al día  Retraso

Porcentaje de ejecución de metas al 31 diciembre del
2021

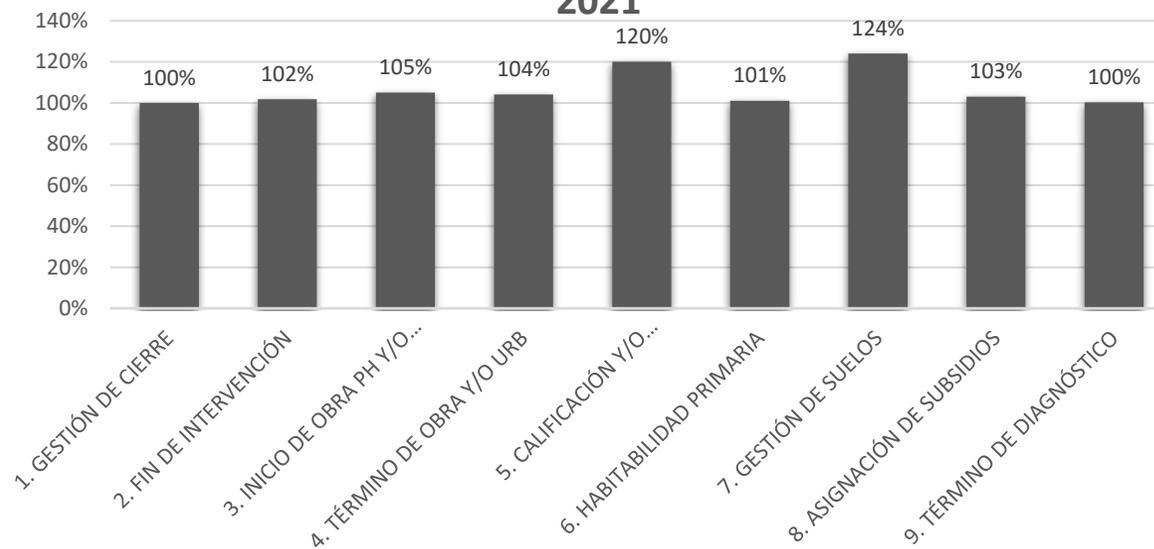

| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021 | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCIÓN |
|--|---------------------|-----------------------|-----------|
| | M\$ | M\$ | 92% |
| | 33.543.216 | 30.799.150 | |
